



ACTA ENTREGA RECEPCION

En la localidad de **Santa Rita Tlahuapan** del Municipio de **Tlahuapan**; del Estado de **Puebla**, siendo las **10:30** horas del día **24** del mes de **marzo** del **2025**, se levanta el Acta de Entrega Recepción de los trabajos correspondientes a la obra con los siguientes datos:

Nombre de la obra:	
"MANTENIMIENTO DE CARRETERA BACHEO EN DIFERENTES CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA."	
No. de obra:	Contrato No.
TLAH-03/2024	TLAH-FAISMUN-03-2024
Oficio de asignación:	Oficio suficiencia presupuestal:
PRES-TLAH-03/001/2024	TES/TLAH-03/01/11/2024
Monto Presupuestado:	Monto del contrato:
\$1,223,332.91 (Un millón doscientos veintitrés mil trescientos treinta y dos pesos 91/100 M.N.)	\$1,223,332.91 (Un millón doscientos veintitrés mil trescientos treinta y dos pesos 91/100 M.N.)
Ramo 33: Ejercicio fiscal: 2024 FORTAMUN: \$ 0.00 FAISMUN: \$ 1,223,332.91 Participaciones: \$ 0.00	Ramo 33: Ejercicio fiscal: 2024 FORTAMUN: \$ 0.00 FAISMUN: \$ 1,223,332.91 Participaciones: \$ 0.00
Fecha de inicio:	Fecha de término:
26 DE DICIEMBRE DEL 2024.	24 DE MARZO DEL 2025.
Por el Municipio:  Ing. Pablo Sánchez Mariaca Residente de obra.	Por el Contratista:  C. María Angelica Gil Barba Persona Física Con Actividad Empresarial Y Profesional Cruz No. 27 San Rafael Tlaxiaco Tlaxiaco, Tlaxiaco C.P. 90718 RFC: GIBA771010TC1



I. Descripción de los trabajos de se reciben:

Unidad	Concepto	Unidad	Cantidad
PARTIDA 1	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,903.40
BACHEO10CM	BACHEO CARPETA ASFÁLTICA EN UN ESPESOR DE 10 CENTÍMETROS., INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,903.40
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	247.44
ACA093	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	17,443.87
SMCL-01	SUMINSTRO Y COLOCACION DE LONA INFORMATIVA DE 2.00 M TS X 1.50 MTS	M2	12.00

II.- Importes totales, ajustes o modificaciones:

Importe del contrato:	\$1,223,332.91 (Un millón doscientos veintitrés mil trescientos treinta y dos Pesos 91/100 M.N.)
¿Se realizó alguna modificación o ajuste al presupuesto contratado?	NO
Convenio modificadorio No.	NO
Ajustes o modificaciones al presupuesto:	NO
Importe del contrato después de ajustes o modificaciones:	N/A

Fecha de inicio según el contrato:	Fecha de término según el contrato:
26 de Diciembre del 2024.	26 de Febrero del 2025.
Fecha de inicio real:	Fecha de término real:
26 de Diciembre del 2024.	24 de Marzo del 2025.
Convenio de ampliación de tiempo:	
CONV-TLAH-03-2024	



III.- Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Fondo	FAISMUN 2024
Monto total del importe estimado	\$1,223,332.91
Anticipo	N/A
Estimación 1	\$813,835.57
Estimación 2 finiquito	\$409,497.34
Total:	\$1,223,332.91

IV.- Constancia de entrega de los archivos y/o documentos generados en la obra, que entrega el contratista a la residencia de la obra o supervisión por parte del contratista:

Certificado de calidad de los trabajos	N/A
Planos actualizados del proyecto ejecutado	Entregado
Estimaciones(s)	Entregado
Números Generadores	Entregado
Croquis	Entregado
Reporte fotográfico	Entregado
Bitácora de obra	Entregado
Laboratorios	Entregado
Manuales de operación	N/A
Información en medio magnético	Entregado

No habiendo más pendientes ni que agregar, se cierra la presente acta a la **11:45** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

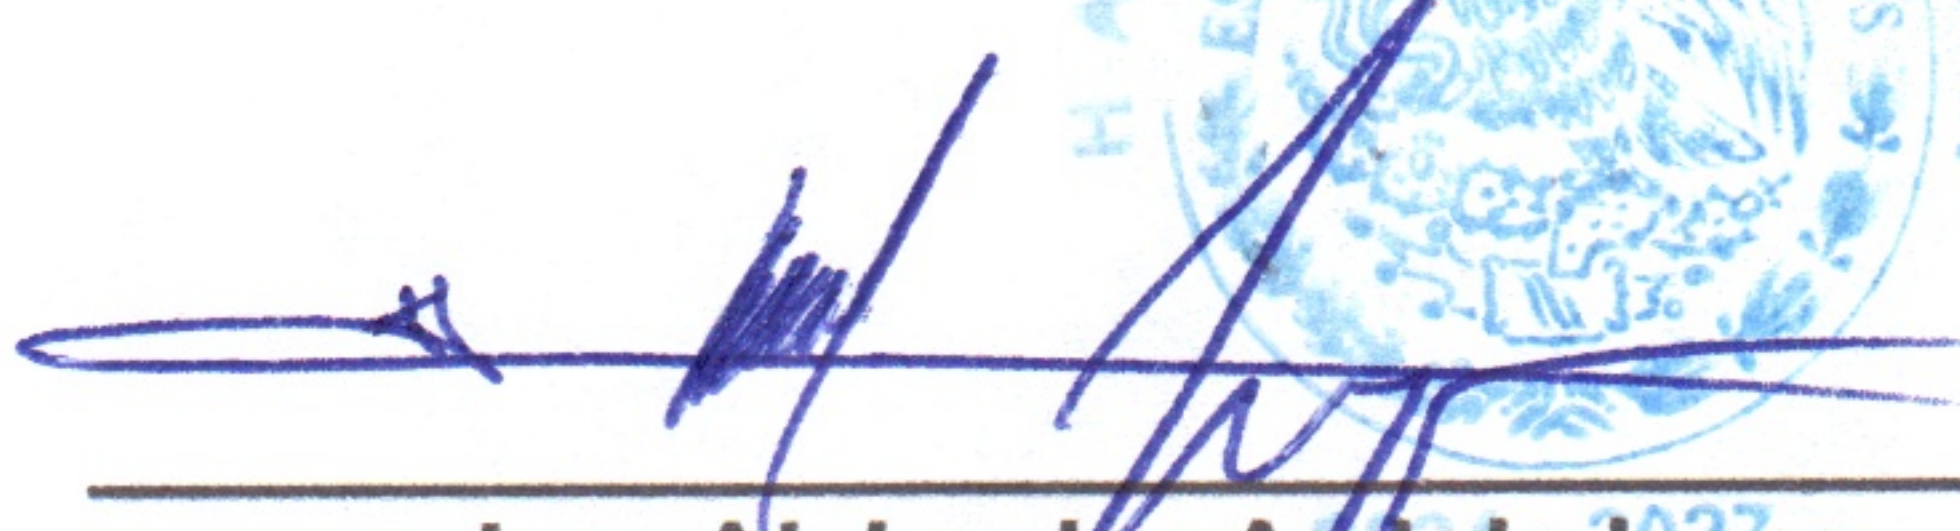


H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
TLAHUAPAN
Servir con vocación y resultados

Por el Municipio contratante
Recibe:

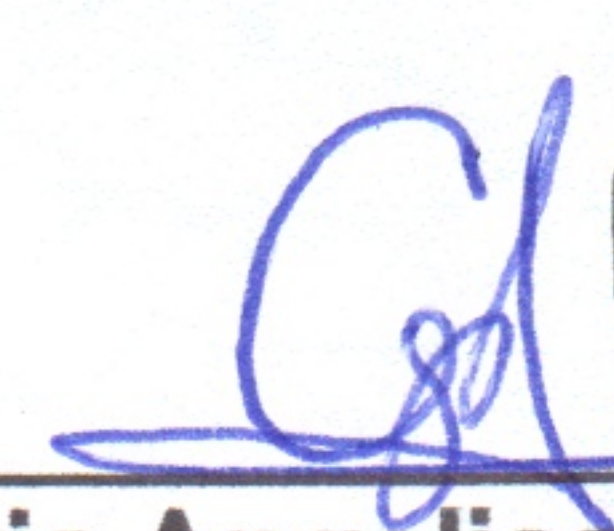
C. Lic. Rosiceli Díaz Hernández.
Presidente Municipal Constitucional.

C. Adán Jurado Lara.
Secretario General.


Ing. Alejandro Arriola Loyo.
Director de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios.

C. María Leticia García Sánchez.
Contralor Municipal.

Por el contratista
Entrega:


C. Maria Angelica Gil Barba
CONSTRUCCIONES GIL
persona física con actividad empresarial.
Maria Angelica Gil Barba
Vareacruz No. 27 San Rafael Tenanyecac
Nativitas, Tlaxcala C.P 90718
RFC: GIBA771010TC1



Por los beneficiarios.

C. Presidente del Comité.

C. Secretario del Comité de Obra.

C. Tesorero del comité de obra.

C. Vocal de Control y Vigilancia.

C. Primer Vocal.

C. Segundo Vocal.
